

**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI**  
**LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GRÓDEK**  
**NA LATA 2016-2020**

przyjętego uchwałą Nr XXXIII/265/17  
Rady Gminy Gródek  
z dnia 27 września 2017 r.

Gródek, CZERWIEC 2021 r.



## WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisem 14 rozdziału Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/265/17 Rady Gminy Gródek z dnia 27 września 2017 r., zwanego dalej „LPR” lub „Programem”, do kompetencji Wójta Gminy Gródek należy powołanie Zespołu ds. Programu Rewitalizacji złożonego z osób z sektora prywatnego, publicznego i społecznego, którego rolą będzie monitoring i sprawozdawczość z realizacji jego założeń. W wykonaniu powyższego, zarządzeniem Nr 113/20 Wójta Gminy Gródek z dnia 16 marca 2020 r. powołano zespół, w składzie:

- Grzegorz Borkowski – radny Rady Gminy Gródek,
- Paulina Cybulin – pracownik Urzędu Gminy Gródek,
- Monika Kazberuk – pracownik Urzędu Gminy Gródek,
- Magdalena Łotysz – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
- Anna Petelska – przedsiębiorca działający na terenie Gminy Gródek,
- Marta Popławska – pracownik Urzędu gminy Gródek,
- Dorota Sulżyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
- Daniel Tymoszewicz – przedsiębiorca działający na terenie Gminy Gródek,

którego zadaniem jest nadzór nad skutecznością i jakością realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez koordynację wdrażania poszczególnych zadań, gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji. Podstawowym narzędziem służącym monitorowaniu LPR są sprawozdania (rzeczowe i finansowe). Pierwsza ocena Zespołu została przeprowadzona w marcu 2020 r. i przedłożona Radnym podczas XV sesji Rady Gminy Gródek, która odbyła się w dniu 31 marca 2020 r. Obejmowała ona swoim zakresem: efektywność wykorzystania środków, skuteczność w zakresie osiągania założonych celów, oddziaływanie na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym na zatrudnienie, funkcjonowanie systemu realizacji. Ocena na zakończenie winna określać długotrwałe efekty wdrożenia Programu, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy. Z ewaluacji końcowej wynikać powinny wskazania odnośnie dalszych kierunków polityki rozwoju gminy, szczególnie w zakresie zdefiniowania czynników, które przyczyniły się do sukcesu lub niepowodzenia wdrażania Programu.

Jako ramowy okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek przyjęto lata 2016-2020, jednakże uchwała w sprawie przyjęcia tego programu została podjęta w III kwartale 2017 r. Niniejsze sprawozdanie końcowe wraz z pierwszym sprawozdaniem stanowią końcową ocenę realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek. Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o dane przekazane przez podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne i zawiera następujące dane:

1. przebieg rzeczowy realizacji przedsięwzięć LPR;
2. postęp finansowy, w tym wielkość zaangażowania środków;
3. sprawność systemu realizacji;
4. napotkane problemy, przeprowadzone kontrole oraz stwierdzone nieprawidłowości;
5. efekty wdrożenia programu - ocena stopnia osiągnięcia wskaźników wdrażania LPR (stan na 31 grudnia 2020 r.);
6. sugerowane dalsze kierunki polityki rozwoju gminy;
7. uwagi członków Zespołu ds. Programu Rewitalizacji oraz zatwierdzenie sprawozdania przez Wójta Gminy Gródek.



## 1. PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, zwanym dalej LPR lub Programem, były środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W dokumencie LPR, wyodrębniono następujące cele:

**Cel szczegółowy 1** Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, oraz przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego poprzez promocję integracji społecznej

Kierunki działań:

- niwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
- zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców - w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych poprzez zapewnienie atrakcyjnych zajęć,
- rozwój kompetencji społecznych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- adaptacja istniejących budynków na potrzeby rozwoju dzieci i młodzieży,
- wspieranie osób i rodzin ze środowisk dotkniętych problemami społecznymi (wykluczenie społeczne, alkoholizm, ubóstwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie),
- zachęcanie mieszkańców do integracji i wspólnego spędzania czasu.

**Cel szczegółowy 2** Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji oraz podniesienie poziomu aktywności gospodarczej mieszkańców poprzez stworzenie i rozwój infrastruktury kulturalnej i turystycznej

Kierunki działań:

- działania aktywizujące mieszkańców,
- zwiększanie aktywności i inicjatyw społecznych i edukacyjnych,
- rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

**Cel szczegółowy 3** Kształtowanie przestrzeni obszaru rewitalizacji oraz zapewnienie wysokiej dostępności i jakości infrastruktury technicznej i społecznej w szczególności posiadającej walory kulturowe i historyczne oraz podniesienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej

Kierunki działań:

- rozbudowa infrastruktury kulturalno-turystycznej,
- promocja kulturalna gminy,
- poprawa stanu technicznego zabytków w obszarze rewitalizacji,
- kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- modernizacja i przebudowa dróg.

**Cel szczegółowy 4** Poprawa stanu technicznego oraz efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i zasobów mieszkaniowych

Kierunki działań:

- modernizacja i remont obiektów użyteczności publicznej,
- dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- rozwój bazy mieszkań socjalnych,
- modernizacja energetyczna budynków.

Zasięg przestrzenny wyznaczonego obszaru rewitalizacji obejmuje 4 podobszary:

- Sołectwo Gródek II,
- Sołectwo Nowosiółki,
- Sołectwo Wiejki,
- Sołectwo Zubki.

Przebieg rzeczowy realizacji Programu w okresie sprawozdawczym wraz z oceną poszczególnych przedsięwzięć został przedstawiony w znajdujących się poniżej „Kartach oceny realizacji przedsięwzięcia”, opracowanych dla poszczególnych przedsięwzięć podstawowych.

| Opis projektu rewitalizacyjnego wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia |  |                     |             |   |   |   |   |                            |
|---|--|---------------------|-------------|---|---|---|---|----------------------------|
| Lp.   | Nazwa zadania i okres realizacji   | Podmiot realizujący | Cele LPR    | Zakres rzeczowy projektu  | Wskaźnik produktu   | Wskaźnik rezultatu  | Sposób pomiaru wskaźnika  | Wartość projektu (tys. zł) |
| 1.  | Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej oraz terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego<br><br>okres realizacji: 2018-2020 | Gmina Gródek        | 1<br>2<br>3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zagospodarowanie zabytku archeologicznego Góry Zamkowej poprzez wykonanie obiektów małej architektury (ławeczki, daszki, bramy wejściowe na Górę, tablice informacyjne, pojemniki na odpady), wieży widokowej, oświetlenia grodziska, nowego, drewnianego ogrodzenia sztachetowego przystającego budynek dawnej rzeźni,</li> <li>- remont nawierzchni i oświetlenia ulicznego ul. Zamkowej prowadzącej do Góry Zamkowej,</li> <li>- stworzenie na Górze Zamkowej Punktu Informacji Turystycznej,</li> <li>- stworzenie oraz wypromowanie produktu będącego wizytówką Gminy Gródek</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba wyremontowanych obiektów: 2, w tym zabytkowych: 1</li> <li>- długość wyremontowanych dróg 0,22 km</li> <li>- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0,2338 ha</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba nowych utworzonych etatów pracy: ½</li> <li>- liczba osób korzystających /rok: 600</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie księgi odwiedziących w Punkcie Informacji Turystycznej,</li> <li>- karta oceny realizacji przedsięwzięcia</li> </ul> | 930                        |

W 2017 r. wykonano dokumentację techniczną „Kompleksowego zagospodarowania Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego”, w tym uzyskano niezbędne zalecenia konserwatorskie oraz pozwolenie na prowadzenie robót na terenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków (wartość: 49 200 zł).

W lutym 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, CEL I.2.: Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, na operacje z zakresu DZIAŁANIA 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali. Wniosek pomimo pozytywnej oceny przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska ostatecznie nie otrzymał dofinansowania i został negatywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W marcu 2021 r. ponownie złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach ponownego naboru przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska i trafił do dalszej oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia.

Całkowita wartość poniesionych nakładów finansowych na przygotowanie przedsięwzięcia: 75 129 zł.

## KARTA OCENY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 1

| Ocena przedsięwzięcia   | TAK | NIE |
|---|-----|-----|
| Trafność interwencji – czy cele interwencji były zgodne ze zidentyfikowanymi problemami i potrzebami?   | X   |     |
| Skuteczność – czy efekt, który osiągnięto jest tym, który planowano osiągnąć  |     | X   |
| Uzyskania wskaźników – czy uzyskano planowane wskaźniki rewitalizacji:  |     | X   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy planowane wskaźniki korelują ze stwierdzonymi problemami na obszarze rewitalizacji</li> <li>• czy uzyskano planowane produkty danego przedsięwzięcia</li> <li>• czy uzyskano planowane rezultaty danego przedsięwzięcia</li> <li>• czy planowane wskaźniki odzwierciedlają poprawę stwierdzonej sytuacji kryzysowej na obszarze rewitalizacji</li> </ul> | X   |     |
| Użyteczność – czy interwencja spełniła oczekiwania adresatów  |     | X   |
| Trwałość – czy osiągnięte efekty przedsięwzięcia mają trwały charakter  |     | X   |

Realizacja zadania nie zakończyła się, w związku z czym nie osiągnięto zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu. Ocena przedsięwzięcia jest niekompletna z uwagi na fakt, iż zadanie jest nadal w trakcie realizacji.



Opis projektu rewitalizacyjnego wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia

| Lp. | Nazwa zadania i okres realizacji   | Podmiot realizujący   | Cele LPR | Zakres rzeczowy projektu  | Wskaźnik produktu   | Wskaźnik rezultatu   | Sposób pomiaru wskaźnika   | Wartość projektu (tys. zł) |
|-----|--|---|----------|---|---|--|--|----------------------------|
| 2.  | Kompleksowy program edukacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej seniorów<br><br><u>okres realizacji:</u><br>2018-2020 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów<br>Oddział Regionalny w Gródku | 1        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prelekcje edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia oraz stworzenie publikacji zawierającej informacje, jak dbać o zdrowie, co robić, żeby zachować sprawność fizyczną</li> <li>i umysłową, a także, jak nie stać się ofiarą oszustw, unikać zagrożeń,</li> <li>- cykl zajęć edukacyjnych dotyczących chorób wieku podeszłego (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, cukrzyca, osteoporoza, choroby układu krążenia),</li> <li>- promocja zdrowego stylu życia poprzez przedstawienie seniorom szeregu możliwości bycia aktywnym</li> <li>w różnych dziedzinach życia: wyjazdy do instytucji kulturalnych (teatry, opera, kino), zajęcia sportowe (basen, fitness dla seniorów), międzypokoleniowe zajęcia komputerowe.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba wydanych publikacji: 1 publikacja (60 egzemplarzy)</li> <li>- liczba zorganizowanych zajęć/wyjazdów: 4 wyjazdy kino/teatr i 48 wyjazdów na basen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba osób korzystająca: zgodnie z aktualną ilością członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Regionalny w Gródku</li> <li>- liczba uczestników projektu: 50 osób</li> </ul> | aktualna ilość członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Regionalny w Gródku | 60                         |

W latach 2018-2019, w ramach przyznanych dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia osób w wieku emerytalnym, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Regionalny w Gródku zorganizował: spotkanie członków pn. „Spotkanie osób w wieku emerytalnym”, wspólny wyjazd pn. „Integracja społeczeństwa związków emerytów” oraz imprezę integracyjną pod hasłem „Integracja społeczeństwa osób trzeciego wieku i członków rodzin” (wartość: 5 648 zł). W okresie październik 2018 r. – lipiec 2019 r. Gmina Gródek zrealizowała projekt „Ja w Internecie” - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, który obejmował swoim zakresem szkolenia komputerowe. W szkoleniach udział wzięło 13 osób z terenu Gminy Gródek w wieku 65 +.

Gminne Centrum Kultury w Gródku w okresie obowiązywania LPR organizowało specjalnie opracowany program gimnastyki przeznaczony dla osób po 50. roku życia – AEROBIK 50+. Natomiast Stowarzyszenie Aktywny Senior w 2020 r. przy wsparciu finansowym Gminy Gródek zrealizowała zadanie „Aqua aerobik seniorów” o wartości 2 000 zł. W 8 zajęciach z aqua aerobiku na basenie w Michałowie udział brało 15 seniorów z terenu gminy Gródek. W okresie sprawozdawczym zorganizowano szereg zajęć, wyjazdów i spotkań dla seniorów. Podmiotami realizującymi był zarówno Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Regionalny w Gródku ale także Gmina Gródek i jej jednostki organizacyjne oraz Stowarzyszenie Aktywny Senior. Większość zaplanowanych wskaźników została osiągnięta. Nie zrealizowano przedsięwzięcia w 100%, jednakże wpływ na to miało m.in. wprowadzenie w Polsce stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, co skutkowało zamknięciem kin, teatrów, basenów itp. oraz wprowadzeniem szeregu obostrzeń i zakazów zgromadzeń.

## KARTA OCENY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 2

| Ocena przedsięwzięcia   | TAK                 | NIE   |
|---|---------------------|---|
| Trafność interwencji – czy cele interwencji były zgodne ze zidentyfikowanymi problemami i potrzebami?   | X                   |   |
| Skuteczność – czy efekt, który osiągnięto jest tym, który planowano osiągnąć  | X                   |   |
| Uzyskania wskaźników – czy uzyskano planowane wskaźniki rewitalizacji:  | X                   | X<br><b>Nieosiągnięte wskaźniki:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba wydanych publikacji: 0</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy planowane wskaźniki korelują ze stwierdzonymi problemami na obszarze rewitalizacji</li> <li>• czy uzyskano planowane produkty danego przedsięwzięcia</li> <li>• czy uzyskano planowane rezultaty danego przedsięwzięcia</li> <li>• czy planowane wskaźniki odzwierciedlają poprawę stwierdzonej sytuacji kryzysowej na obszarze rewitalizacji</li> </ul> | X<br><br>X<br><br>X |   |
| Użyteczność – czy interwencja spełniła oczekiwania adresatów  | X                   |   |
| Trwałość – czy osiągnięte efekty przedsięwzięcia mają trwały charakter  | X                   |   |

| Opis projektu rewitalizacyjnego wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia  |  |                     |          |  |  |                                       |  |                            |
|--|--|---------------------|----------|--|--|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Lp.  | Nazwa zadania i okres realizacji   | Podmiot realizujący | Cele LPR | Zakres rzeczowy projektu   | Wskaźnik produktu  | Wskaźnik rezultatu                    | Sposób pomiaru wskaźnika               | Wartość projektu (tys. zł) |
| 3.   | Kompleksowe oznakowanie szlaków, miejsc pamięci, szlaków i atrakcji turystycznych<br>okres realizacji: 2018-2020 | Gmina Gródek        | 2<br>3   | - zaprojektowanie, wykonanie i montaż oznakowania szlaków, miejsc pamięci, szlaków turystycznych, atrakcji turystycznych (20 tablic),<br>- zaprojektowanie i wydruk nowych materiałów informacyjno-promocyjnych (m.in. przewodników i map) | - liczba oznakowanych obiektów: 13, w tym wpisanych do rejestru zabytków: 8,<br>- liczba oznakowanych szlaków turystycznych: 5 | - liczba osób korzystająca / rok: 600 | karta oceny realizacji przedsięwzięcia | 65                         |
| <p>W 2018 r. odnowiono oznakowanie szlaku rowerowego „Kresowe wędrowniki” (kolor znaków zielony) na długości 7 km i przebiegu: granica gminy – gaj. Kuberka – Królowy Most oraz pieszego „Skrajem Puszczy Knyszyńskiej” (kolor znaków żółty) na długości 13 km i przebiegu: granica gminy – Dzierniakowo – Gródek – Straszewo (wartość: 1 800 zł). W 2019 r. odnowiono oznakowanie szlaków pieszych: „Tatarski Mały” (kolor znaków niebieski) na długości 10 km i przebiegu: Waliły Stacja – Słuczanka – Królowe Stojło – leśniczówka Józefowo – Józefowo – granica Gminy Gródek oraz o nazwie „Do Góran” (kolor znaków żółty) na długości 10 km i przebiegu: Waliły Stacja – Słuczanka – Królowe Stojło – granica Gminy Gródek (wartość: 1 800 zł). W 2020 r. odnowiono i zamontowano dodatkowe drogowskazy oznakowania szlaku rowerowego Jałówka - Królowy Most na odcinku „obwodnica Gminy Gródek”: Chomontowce - Bobrowniki – Gobiaty – Świsłoczany – Mostowlany (wartość 2 000 zł). Ponadto w ramach przeglądu gwarancyjnego odnowiono oznakowanie i infrastrukturę szlaku rowerowego Green Velo Częstochwa osiągnięto wskaźnik produktu: liczba oznakowanych szlaków turystycznych – 5. Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, co skutkowało m. in. zakazem działalności turystycznej i sportowej nie można określić poziomu osiągniętych wskaźników rezultatu.</p> |  |                     |          |  |  |                                       |  |                            |

### KARTA OCENY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 3

| Ocena przedsięwzięcia  | TAK   | NIE  |
|--|---|--|
| Trafność interwencji – czy cele interwencji były zgodne ze zidentyfikowanymi problemami i potrzebami?  | X   |  |
| Skuteczność – czy efekt, który osiągnięto jest tym, który planowano osiągnąć   | X   |  |
| Uzyskania wskaźników – czy uzyskano planowane wskaźniki rewitalizacji:   | X   | X  |
|  | <b>Osiągnięte wskaźniki:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba oznakowanych szlaków turystycznych: 5</li> </ul> | <b>Nieosiągnięte wskaźniki:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba wydanych publikacji: 0</li> <li>• liczba oznakowanych obiektów zabytkowych: 0</li> <li>• liczba osób korzystających: nie badano z uwagi na epidemię</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy planowane wskaźniki korelują ze stwierdzonymi problemami na obszarze rewitalizacji</li> </ul>                     | X   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy uzyskano planowane produkty danego przedsięwzięcia</li> </ul>   |   | X  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy uzyskano planowane rezultaty danego przedsięwzięcia</li> </ul>  |   | nie badano   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy planowane wskaźniki odzwierciedlają poprawę stwierdzonej sytuacji kryzysowej na obszarze rewitalizacji</li> </ul> | X   |  |
| Użyteczność – czy interwencja spełniła oczekiwania adresatów   | X   |  |
| Trwałość – czy osiągnięte efekty przedsięwzięcia mają trwały charakter   | X   |  |

| Opis projektu rewitalizacyjnego wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia  |  |                     |             |   |   |  |  |                            |
|--|--|---------------------|-------------|---|---|--|--|----------------------------|
| Lp.  | Nazwa zadania i okres realizacji   | Podmiot realizujący | Cele LPR    | Zakres rzeczowy projektu  | Wskaźnik produktu   | Wskaźnik rezultatu   | Sposób pomiaru wskaźnika               | Wartość projektu (tys. zł) |
| 4.   | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnym<br><br>okres realizacji: 2018-2020 | Gmina Gródek        | 1<br>2<br>4 | - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego dworca PKP w Zubkach ma obejmować: przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego budynku, wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie wszystkich robót uwzględnionych w dokumentacji technicznej, w tym przede wszystkim: przystosowanie układu funkcjonalno-przestrzennego do planowanej funkcji, wymaganą technologię, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, bezpieczeństwa oraz warunków technicznych, jak również dostosowanie obiektu do wymagań użytkowników, wyposażenie nowopowstałych lokali socjalnych.<br>- organizacja 4 spotkań/warsztatów dla rodzin zamieszkujących lokale socjalne z zakresu: aktywnego poszukiwania pracy, umiejętności interpersonalnych, komunikacji społecznej (zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się, rozwijanie technik aktywnego słuchania, podniesienie umiejętności radzenia sobie z barierami w komunikacji), pozytywnego wizerunku własnej osoby, radzenie sobie w trudnych sytuacjach: nabywanie umiejętności analizy i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ćwiczenie asertywności, nabywanie umiejętności korzystania z własnych praw. | - liczba wyremontowanych obiektów: 1,<br>- liczba nowych mieszkań socjalnych: 5 | - liczba osób korzystających z nowych mieszkań: ok. 15,<br>- liczba zorganizowanych spotkań: 4 | karta oceny realizacji przedsięwzięcia | 675                        |
| W 2018 r. wykonano inwentaryzację budowlaną budynku dawnego dworca PKP (wartość: 5 535 zł). Z uwagi na terminy realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych określone w LPR oraz brak projektów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych, wykonanie przedmiotowego zadania przesunięto na kolejne lata. |  |                     |             |   |   |  |  |                            |

## KARTA OCENY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 4

| Ocena przedsięwzięcia  | TAK | NIE |
|--|-----|-----|
| Trafność interwencji – czy cele interwencji były zgodne ze zidentyfikowanymi problemami i potrzebami?  | X   |     |
| Skuteczność – czy efekt, który osiągnięto jest tym, który planowano osiągnąć   |     | X   |
| Uzyskania wskaźników – czy uzyskano planowane wskaźniki rewitalizacji:   |     | X   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy planowane wskaźniki korelują ze stwierdzonymi problemami na obszarze rewitalizacji</li> </ul>                     | X   |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy uzyskano planowane produkty danego przedsięwzięcia</li> </ul>   |     | X   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy uzyskano planowane rezultaty danego przedsięwzięcia</li> </ul>  |     | X   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy planowane wskaźniki odzwierciedlają poprawę stwierdzonej sytuacji kryzysowej na obszarze rewitalizacji</li> </ul> |     | X   |
| Użyteczność – czy interwencja spełniła oczekiwania adresatów   |     | X   |
| Trwałość – czy osiągnięte efekty przedsięwzięcia mają trwały charakter   |     | X   |


Zadanie nie zostało zrealizowane. Możliwość wykonania zadania jest ściśle związana z pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

| Opis projektu rewitalizacyjnego wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia   |   |                     |          |   |   |   |  |                            |
|---|---|---------------------|----------|---|---|---|--|----------------------------|
| Lp.   | Nazwa zadania i okres realizacji  | Podmiot realizujący | Cele LPR | Zakres rzeczowy projektu  | Wskaźnik produktu   | Wskaźnik rezultatu  | Sposób pomiaru wskaźnika               | Wartość projektu (tys. zł) |
| 5.  | Przebudowa budynku O.S.P. i adaptacja na świetlicę wiejską w Nowosiólkach<br><br>okres realizacji:<br>2017-2018 | Gmina Gródek        | 1<br>3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont i przebudowa budynku O.S.P. w Nowosiólkach ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską,</li> <li>- wyposażenie świetlicy w pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,</li> <li>- zagospodarowanie terenów zielonych przyległych do świetlicy wraz z wykonaniem obiektów małej architektury (plac zabaw, siłownie itp.).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba wyremontowanych obiektów: 1,</li> <li>- liczba obiektów zagospodarowanych na świetlice środowiskowe: 1,</li> <li>- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0,0806 ha</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba nowo utworzonych etapów pracy: 1,</li> <li>- liczba osób korzystająca/rok: 300</li> </ul> | karta oceny realizacji przedsięwzięcia | 288                        |
| <p>W ramach projektu pn. „Rewitalizacja byłego budynku OSP i przyległych terenów w Nowosiólkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w 2019 r. zrealizowano całość zadania rewitalizacyjnego, tj. wyremontowano budynek O.S.P. w Nowosiólkach, który aktualnie stanowi świetlicę wiejską (wartość: 387 028 zł) oraz zagospodarowano tereny przyległe poprzez budowę siłowni zewnętrznej (wartość: 16 596 zł).</p> |   |                     |          |   |   |   |  |                            |

## KARTA OCENY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 5

| Ocena przedsięwzięcia  | TAK  | NIE  |
|--|--|--|
| Trafność interwencji – czy cele interwencji były zgodne ze zidentyfikowanymi problemami i potrzebami?        | X  |  |
| Skuteczność – czy efekt, który osiągnięto jest tym, który planowano osiągnąć                                 | X  |  |
| Uzyskania wskaźników – czy uzyskano planowane wskaźniki rewitalizacji:                                       | X  | X  |
|  | <p><b>OŚIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba wyremontowanych obiektów: 1,</li> <li>• liczba obiektów zagospodarowanych na świetlice środowiskowe: 1,</li> <li>• powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0,0806 ha</li> <li>• liczba osób korzystająca/rok: 300</li> </ul> | <p><b>NIEOSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba nowo utworzonych etatów pracy: 0</li> </ul> |
| • czy planowane wskaźniki korelują ze stwierdzonymi problemami na obszarze rewitalizacji                     | X  |  |
| • czy uzyskano planowane produkty danego przedsięwzięcia   | X  |  |
| • czy uzyskano planowane rezultaty danego przedsięwzięcia  | X  |  |
| • czy planowane wskaźniki odzwierciedlają poprawę stwierdzonej sytuacji kryzysowej na obszarze rewitalizacji | X  |  |
| Użyteczność – czy interwencja spełniła oczekiwania adresatów   | X  |  |
| Trwałość – czy osiągnięte efekty przedsięwzięcia mają trwały charakter                                       | X  |  |



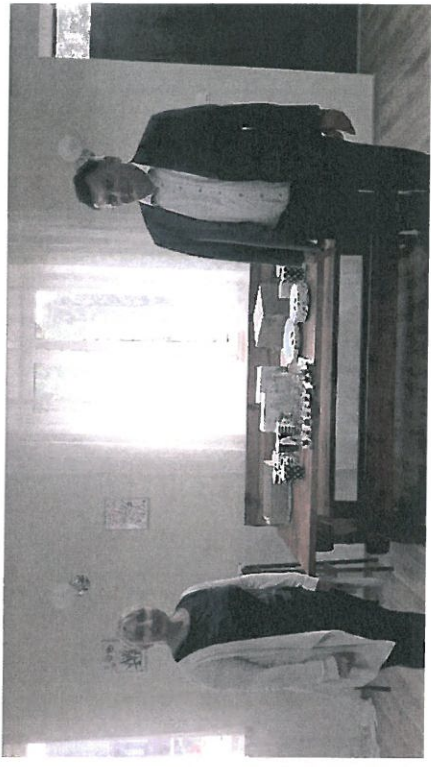

Z wyremontowanej świetlicy oraz terenów przyległych korzystają w szczególności mieszkańcy miejscowości Nowosiółki oraz miejscowości przyległych. Odbývają się tam imprezy i spotkania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i integracyjnym.

Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, Gmina Gródek wraz z Gminnym Centrum Kultury w Gródku zrezygnowała z organizacji warsztatów i zajęć w świetlicy.

W 2020 r. w ramach **"PROGRAMU ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"** Gmina Gródek zakupiła niezbędne wyposażenie kuchenne do świetlicy: szklanki do kawy, herbaty i napojów, zestawy talerzy oraz sztuce. Wartość zakupionego wyposażenia: 1 153 zł.



| Opis projektu rewitalizacyjnego wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia   |   |                     |          |   |  |   |  |                            |
|---|---|---------------------|----------|---|--|---|--|----------------------------|
| Lp.   | Nazwa zadania i okres realizacji  | Podmiot realizujący | Cele LPR | Zakres rzeczowy projektu  | Wskaźnik pro-dukty   | Wskaźnik rezultatu  | Sposób pomiaru wskaźnika               | Wartość projektu (tys. zł) |
| 6.  | Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach<br><br>okres realizacji:<br>2017-2018 | Gmina Gródek        | 1<br>3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont i przebudowa budynku byłej szkoły w Wiejkach ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską,</li> <li>- wyposażenie świetlicy w pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,</li> <li>- zagospodarowanie terenów zielonych przyległych do świetlicy wraz z wykonaniem obiektów małej architektury (plac zabaw, siłownię itp.).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba wyremontowanych obiektów: 1,</li> <li>- liczba obiektów zagospodarowanych na świetlice: 1,</li> <li>- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0,7944 ha</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba nowo utworzonych etapów pracy: 1,</li> <li>- liczba osób korzystająca/rok: 300</li> </ul> | karta oceny realizacji przedsięwzięcia | 364                        |
| <p>W ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w 2019 r. zrealizowano całość zadania rewitalizacyjnego, tj. wyremontowano budynek dawnej szkoły w Wiejkach, który aktualnie stanowi świetlicę wiejską (wartość: 513 928 zł) oraz zagospodarowano tereny przyległe poprzez budowę placu zabaw (wartość: 24 378 zł). Ponadto w ramach projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Gródek” współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”, zakupiono wyposażenie do świetlicy o łącznej wartości 8 569 zł.</p> |   |                     |          |   |  |   |  |                            |

## KARTA OCENY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6

| Ocena przedsięwzięcia  | TAK   | NIE  |
|--|---|--|
| Trafność interwencji – czy cele interwencji były zgodne ze zidentyfikowanymi problemami i potrzebami?        | X   |  |
| Skuteczność – czy efekt, który osiągnięto jest tym, który planowano osiągnąć                                 | X   |  |
| Uzyskania wskaźników – czy uzyskano planowane wskaźniki rewitalizacji:                                       | X   | X  |
|  | <p><b>OŚSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba wyremontowanych obiektów: 1,</li> <li>• liczba obiektów zagospodarowanych na świetlice: 1</li> <li>• powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0,7944 ha</li> <li>• liczba osób korzystająca/rok: 300</li> </ul> | <p><b>NIEOSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba nowo utworzonych etatów pracy: 0</li> </ul> |
| • czy planowane wskaźniki korelują ze stwierdzonymi problemami na obszarze rewitalizacji                     | X   |  |
| • czy uzyskano planowane produkty danego przedsięwzięcia   | X   |  |
| • czy uzyskano planowane rezultaty danego przedsięwzięcia  | X   |  |
| • czy planowane wskaźniki odzwierciedlają poprawę stwierdzonej sytuacji kryzysowej na obszarze rewitalizacji | X   |  |
| Użyteczność – czy interwencja spełniła oczekiwania adresatów   | X   |  |
| Trwałość – czy osiągnięte efekty przedsięwzięcia mają trwały charakter                                       | X   |  |



Z wyremontowanej świetlicy korzystają w szczególności mieszkańcy miejscowości Wiejki oraz miejscowości przyległych. Odbywają się tam imprezy i spotkania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i integracyjnym.

W 2020 r. ramach **"PROGRAMU ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"** na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa Podlaskiego, Gmina Gródek zakupiła wyposażenie do świetlicy na kwotę 2 623,98 zł: stół do tenisa stołowego i piłkarzyki, przeznaczone głównie dla dzieci. W okresie czerwiec - sierpień 2020 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku w świetlicy wiejskiej zorganizowało: warsztaty robienia lizaków i cukierków, warsztaty robienia wianków, warsztaty „Tylko się ubrudź”.

Źródło fot.: <https://www.facebook.com/solectwo.wiejki/>





**Opis projektu rewitalizacyjnego wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia**

| Lp. | Nazwa zadania i okres realizacji  | Podmiot realizujący | Cele LPR         | Zakres rzeczowy projektu   | Wskaźnik produktu   | Wskaźnik rezultatu                   | Sposób pomiaru wskaźnika               | Wartość projektu (tys. zł) |
|-----|---|---------------------|------------------|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------|
| 7.  | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną<br>okres realizacji: 2016-2020 | Gmina Gródek        | 1<br>2<br>3<br>4 | - rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w kierunku zachodnim. Planuje się budynek piętrowy, niepodpiwniczony o wysokości analogicznej jak budynek istniejący. Główne wejście zostanie przeniesione do nowej części. Przy wejściu zaprojektowano pochylnię a wewnątrz dźwigi dla osób niepełnosprawnych, co umożliwi bezpieczny dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózkach,<br>- adaptacja sali konferencyjnej na potrzeby spotkań/warsztatów i kursów dla mieszkańców. | - liczba wyremontowanych obiektów: 1,<br>- liczba zorganizowanych spotkań: 24,<br>- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0,7376 ha | - liczba osób korzystająca/rok: 1000 | karta oceny realizacji przedsięwzięcia | 2 557                      |

W 2019 r. zlecono wykonanie szczegółowej charakterystyki energetycznej budynku projektowanego i referencyjnego (wartość: 25 830 zł) oraz aktualizacji posiadanej dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy Gródek (wartość: 89 175 zł). W wyniku prac projektowych przewidziano dodatkowe rozwiązania w zakresie przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii, których zastosowanie umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji w zakresie niskoemisyjnych budynków użyteczności publicznej. Ponadto, w ramach prac przygotowawczych, niezbędne było wykonanie dokumentacji przebudowy fragmentu istniejącej kanalizacji teletechnicznej wraz z przesunięciem studni kablowej przy budynku Urzędu Gminy Gródek (wartość: 3 075 zł).

## KARTA OCENY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 7

| Ocena przedsięwzięcia  | TAK | NIE |
|--|-----|-----|
| Trafność interwencji – czy cele interwencji były zgodne ze zidentyfikowanymi problemami i potrzebami?  | X   |     |
| Skuteczność – czy efekt, który osiągnięto jest tym, który planowano osiągnąć   |     | X   |
| Uzyskania wskaźników – czy uzyskano planowane wskaźniki rewitalizacji:   |     | X   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy planowane wskaźniki korelują ze stwierdzonymi problemami na obszarze rewitalizacji</li> </ul>                     | X   |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy uzyskano planowane produkty danego przedsięwzięcia</li> </ul>   |     | X   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy uzyskano planowane rezultaty danego przedsięwzięcia</li> </ul>  |     | X   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy planowane wskaźniki odzwierciedlają poprawę stwierdzonej sytuacji kryzysowej na obszarze rewitalizacji</li> </ul> |     | X   |
| Użyteczność – czy interwencja spełniła oczekiwania adresatów   |     | X   |
| Trwałość – czy osiągnięte efekty przedsięwzięcia mają trwały charakter   |     | X   |

Zadanie nie zostało zrealizowane. Możliwość wykonania zadania jest ściśle związana z pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.



## 2. POSTĘP FINANSOWY, W TYM WYSOKOŚĆ ZAANGAŻOWANIA ŚRODKÓW

Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków została zaprezentowana w zestawieniu poniżej

| Zestawienie kosztów poniesionych na realizację projektów rewitalizacyjnych wraz ze wskazaniem źródła ich pochodzenia |   |                                     |  |                                      |                             |  |                        |   |  |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|---|--|
| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia   | Szacowany całkowity koszt (tys. zł) | Dotychczas poniesione koszty (tys. zł) | Całkowita wartość zadania (tys. zł)* | Środki zewnętrzne (tys. zł) | Źródło dofinansowania                  | Wkład własny (tys. zł) | Ocena poziomu wykorzystania środków (%) |  |
| 1  | Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej oraz terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego                           | 930                                 | 75,129                                 | -                                    | -                           | -                                      | 75,129                 | 8,08                                    |  |
| 2  | Kompleksowy program edukacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej seniorów   | 60                                  | 7,648                                  | -                                    | -                           | -                                      | 7,648                  | 12,75                                   |  |
| 3  | Kompleksowe oznakowanie zabytków, miejsc pamięci, szlaków i atrakcji turystycznych                                      | 65                                  | 5,6                                    | -                                    | -                           | -                                      | 3,6                    | 8,61                                    |  |
| 4  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnym | 675                                 | 5,535                                  | -                                    | -                           | -                                      | 5,535                  | 0,82                                    |  |
| 5  | Przebudowa budynku O.S.P. i adaptacja na świetlicę wiejską w Nowosiólkach   | 288                                 | 380,869                                | 380,869                              | 258,147                     | EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 | 122,722                | 132,25                                  |  |
| 6  | Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach   | 364                                 | 538,306                                | 538,306                              | 367,406                     | EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 | 170,9                  | 147,89                                  |  |
| 7  | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną                        | 2 577                               | 180,985                                | -                                    | -                           | -                                      | 180,985                | 7,02                                    |  |
| * dla inwestycji zrealizowanych  |   |                                     |  |                                      |                             |  |                        |   |  |

**Wnioski:** najniższe wskaźniki wykorzystania zaplanowanych środków osiągnęły niezrealizowane zadania inwestycyjne tj. Nr 1, 4, 7. Dodatkowo wykorzystano stosunkowo niewiele środków zaplanowanych na zadanie Nr 3, z uwagi na wprowadzone obostrzenia i zakazy związane z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, dotyczące m. in. turystyki i sportu.



### 3. SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REALIZACJI

Realizacja LPR Gminy Gródek w większości zadań przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. Rok 2018 został wykorzystany na stopniowe uruchamianie pełnej funkcjonalności niniejszego programu. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Gródek LPR wykonano następujące zadania: powołano pełną strukturę zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji przewidzianą w ramach niniejszego dokumentu, uruchomiono system monitorowania i oceny wdrażania LPR, systematycznie podejmowano kroki w kierunku uruchomienia poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

| Harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych |   |   |
|--|---|---|
| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia   | Czas realizacji                             |
| 1  | Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej oraz terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego                           | 2018-2022                                   |
| 2  | Kompleksowy program edukacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej seniorów   | 2018-2020 i kontynuacja w latach następnych |
| 3  | Kompleksowe oznakowanie zabytków, miejsc pamięci, szlaków i atrakcji turystycznych                                      | 2018-2020 i kontynuacja w latach następnych |
| 4  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnym | 2018-2023                                   |
| 5  | Przebudowa budynku O.S.P. i adaptacja na świetlicę wiejską w Nowosiólkach   | 2017-2019 – zrealizowano                    |
| 6  | Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach   | 2017-2019 – zrealizowano                    |
| 7  | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną                        | 2018-2023                                   |

### 4. NAPOTKANE PROBLEMY, PRZEPROWADZONE KONTROLE ORAZ STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI

W wyniku dokonanej analizy stanu realizacji zadań przewidzianych w LPR, w pierwszej ocenie Programu, powołany Zespół ds. Programu Rewitalizacji stwierdził ryzyko nieosiągnięcia w określonych ramach czasowych efektów rzeczowych i rezultatów dotyczących dwóch inwestycji:

- przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnego dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi;
- rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy Gródek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Zadania, o których mowa powyżej także aktualnie są na wstępnym etapie procesu inwestycyjnego. W ramach aktualnych harmonogramów naborów na dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, brak jest informacji o perspektywach umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych ze źródeł krajowych i europejskich.

Ponadto harmonogram realizacji zadania związanego z kompleksowym zagospodarowaniem Góry Zamkowej musi zostać zaktualizowany na lata 2018 – 2022, z uwagi na nieprzyznanie dofinansowanie i ponowne ubieganie się o środki z RPO WP na lata 2014-2020.

Jednocześnie, na podstawie szacowanej wartości projektów rewitalizacyjnych oraz mnogość pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Gródek w latach 2020-2021, nie ma możliwości wyodrębnienia środków własnych na realizację przedsięwzięć w ramach LPR. W związku z powyższym zaleca się rozszerzenie czasu wykonania tych inwestycji poza okres realizacji Programu, tj. do 2023 r., co wyrażono w aktualizacji harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Negatywny wpływ na zamierzone wskaźniki produktów i rezultatów miało również wprowadzenie w Polsce stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Wprowadzone obostrzenia i zakazy uniemożliwiły realizację większość tak zwanych „zadań miękkich”, związanych przede wszystkim ze spotkaniami oraz warsztatami edukacyjnymi, integracyjnymi i rekreacyjnymi. Ponadto wprowadzenie pracy zdalnej w administracji publicznej spowodowało znaczne wydłużenie procedur administracyjnych w uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów do realizacji przedsięwzięć, a także zmniejszyło możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

## 5. OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW WDRAŻANIA LPR (stan na 31 grudnia 2020 r.)

| Ocena stopnia osiągnięcia wskaźników wdrażania LPR (stan na 31 grudnia 2020 r.)  |   |             |                    |                |  |                          |  |
|--|---|-------------|--------------------|----------------|--|--------------------------|--|
| Założenia LPR - cele szczegółowe   | Nazwa wskaźnika   | Jedn. miary | Źródło danych      | Wartość bazowa |  | Wartość docelowa         |  |
| Wskaźniki oddziaływania  |   |             |                    |                |  |                          |  |
| <p>Cel szczegółowy 1. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, oraz przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego poprzez promocję integracji społecznej</p> | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 100 osób           | os.         | GOPS               | Podobszary     | Gródek II: 7,63<br>Nowosiółki: 10,71<br>Wiejki: 7,28<br>Zubki: 14,29                 | Wartość poniżej średniej | Gródek II: 11,75<br>Nowosiółki: 10,00<br>Wiejki: 23,48<br>Zubki: 11,11 |
|  | Liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z tytułu ubóstwa na 100 osób | os.         | GOPS               | Podobszary     | Średnia gminy<br>Gródek II: 5,81<br>Nowosiółki: 10,71<br>Wiejki: 5,30<br>Zubki: 9,52 | Wartość poniżej średniej | Gródek II: 8,94<br>Nowosiółki: 10,00<br>Wiejki: 9,02<br>Zubki: 0,0     |
|  | Liczba Niebieskich Kart na 100 osób   | szt.        | GOPS               | Podobszary     | Średnia gminy<br>Gródek II: 0,65<br>Nowosiółki: 0,00<br>Wiejki: 1,32<br>Zubki: 0,00  | Wartość poniżej średniej | Gródek II: 0,65<br>Nowosiółki: 0,00<br>Wiejki: 0,00<br>Zubki: 0,00     |
|  | Liczba bezrobotnych ogółem na 100 osób  | os.         | PUP Białystok      | Podobszary     | Średnia gminy<br>Gródek II: 7,74<br>Nowosiółki: 3,57<br>Wiejki: 5,30<br>Zubki: 4,76  | Wartość poniżej średniej | Gródek II: 4,85<br>Nowosiółki: 3,33<br>Wiejki: 3,79<br>Zubki: 0,00     |
|  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 osób                                | os.         | PUP Białystok      | Podobszary     | Średnia gminy<br>Gródek II: 4,52<br>Nowosiółki: 3,57<br>Wiejki: 5,30<br>Zubki: 4,76  | Wartość poniżej średniej | Gródek II: 3,54<br>Nowosiółki: 3,33<br>Wiejki: 3,78<br>Zubki: 0,00     |
|  | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze CEIDG na 100 osób   | szt.        | Urząd Gminy Gródek | Podobszary     | Średnia gminy<br>Gródek II: 4,41<br>Nowosiółki: 7,14<br>Wiejki: 1,99<br>Zubki: 0,00  | Wartość powyżej średniej | Gródek II: 4,09<br>Nowosiółki: 10,00<br>Wiejki: 0,76<br>Zubki: 0,00    |
|  |   |             |                    |                | Średnia gminy  | 4,51                     |  |
|  |   |             |                    |                |  |                          |  |
|  |   |             |                    |                |  |                          |  |
|  |   |             |                    |                |  |                          |  |

|  |  |   |   |   |  |   |   |  |   |      |              |   |   |        |       |
|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|------|--------------|---|---|--------|-------|
| stworzenie i rozwój infrastruktury kulturalnej i turystycznej  | Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze CEIDG na 100 osób | szt.  | Urząd Gminy Gródek                              | Podobszary                                      | Gródek II: 0,43<br>Nowosiółki: 0,00<br>Wiejki: 0,66<br>Zubki: 0,00 | 0,27  | Wartość powyżej średniej                        | Gródek II: 0,43<br>Nowosiółki: 3,33<br>Wiejki: 0,00<br>Zubki: 0,00 |   |      |              |   |   |        |       |
|  |  |   |   | Średnia gminy                                   | 0,59   |   |   |  |   |      |              |   |   |        |       |
|  |  |   |   | Podobszary                                      | Gródek II: 0,17<br>Nowosiółki: 0,00<br>Wiejki: 0,01<br>Zubki: 0,03 |   |   | 0,05   | Wartość powyżej średniej                            |      |              |   |   |        |       |
|  |  |   |   | Średnia gminy                                   | 0,06   |   |   |  |   |      |              |   |   |        |       |
| Ciel szczegółowy 3<br>Kształtowanie przestrzeni obszaru rewitalizacji oraz zapewnienie wysokiej dostępności i jakości infrastruktury technicznej i społecznej w szczególności posiadającej walory kulturowe i historyczne oraz podniesienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej | % powierzchni terenów zielonych (Bz)   | %   | Urząd Gminy Gródek                              | Podobszary                                      | Gródek II: 0,32<br>Nowosiółki: 0,00<br>Wiejki: 0,00<br>Zubki: 0,00 | 0,08  | Wartość powyżej średniej                        | Gródek II: 0,32<br>Nowosiółki: 0,00<br>Wiejki: 0,00<br>Zubki: 0,00 |   |      |              |   |   |        |       |
|  |  |   |   | Średnia gminy                                   | 0,12   |   |   |  |   |      |              |   |   |        |       |
|  |  |   |   | Podobszary                                      |  |   |   |  |   |      |              |   |   |        |       |
|  |  |   |   | Średnia gminy                                   |  |   |   |  |   |      |              |   |   |        |       |
| Przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe   | Wskaźniki produktu - przedsięwzięcia podstawowe                                    | Wskazniki produktu - przedsięwzięcia podstawowe | Wskazniki produktu - przedsięwzięcia podstawowe | Wskazniki produktu - przedsięwzięcia podstawowe | Wskazniki produktu - przedsięwzięcia podstawowe                    | Wskazniki produktu - przedsięwzięcia podstawowe | Wskazniki produktu - przedsięwzięcia podstawowe | Wskazniki produktu - przedsięwzięcia podstawowe                    |   |      |              |   |   |        |       |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  | Powierzchnia rewitalizowanego obszaru               | ha   | wnioskodawca | 0 | - | 1,8464 | 0,875 |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  | Długość wyremontowanej drogi                        | km   | wnioskodawca | 0 | - | 0,22   | 0     |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  | Liczba wspartych obiektów na obszarze rewitalizacji | szt. | wnioskodawca | 2 | - | 6      | 2     |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  | Liczba nowych mieszkań społecznych                  | szt. | wnioskodawca | 0 | - | 5      | 0     |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  | Liczba zorganizowanych zajęć/wyjazdów               | szt. | wnioskodawca | 0 | - | 52     | 12    |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  | Liczba oznakowanych obiektów kultury                | szt. | wnioskodawca | 0 | - | 13     | 0     |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  | Liczba oznakowanych szlaków turystycznych           | szt. | wnioskodawca | 5 | - | 5      | 5     |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  | Liczba zorganizowanych spotkań                      | szt. | wnioskodawca | 0 | - | 28     | 10    |
|  |  |   |   |   |  |   |   |  | Liczba wydanych publikacji                          | szt. | wnioskodawca | 0 | - | 1x60   | 0     |







## 6. SUGEROWANE DALSZE KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU GMINY

Realizację końcowego okresu Programu - najbardziej intensywnego pod względem zaplanowanych działań rewitalizacyjnych, przerwał stan epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Zadania inwestycyjne zaplanowane na początku harmonogramu LPR, zostały zrealizowane bez większych komplikacji, przede wszystkim z uwagi na skuteczne pozyskiwanie środków z funduszy europejskich. Trudności sprawiło zakończenie rozpoczętych działań, których finał przewidziano na ostatni rok Programu. Z uwagi na powyższe, w ramach dalszych, priorytetowych kierunków polityki rozwoju Gminy względem LPR, Zespół ds. Programu Rewitalizacji zaleca zakończenie niżej wymienionych, rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych, po uprzednim pozyskaniu dofinansowań ich realizacji z dostępnych źródeł zewnętrznych:

- Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej oraz terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego;
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnym;
- Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

W przypadku ustabilizowania się aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej Komisja rekomenduje także wznowienie zaplanowanych działań miękkich, związanych z organizacją imprez, spotkań oraz warsztatów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i integracyjnym.



## 7. UWAGI CZŁONKÓW ZESPOŁU DS. PROGRAMU REWITALIZACJI ORAZ ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO PRZEZ WÓJTA GMINY GRÓDEK

Wszyscy członkowie zespołu ds. Programu Rewitalizacji, powołani zarządzeniem Nr 113/20 Wójta Gminy Gródek z dnia 16 marca 2020 r., oświadczają, że zapoznali się z niniejszym sprawozdaniem końcowym z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020 przyjętego uchwałą nr XXXIII/265/17 Rady Gminy Gródek z dnia 27 września 2017 r., i nie wnoszą żadnych uwag do jego treści.

Grzegorz Borkowski

Grzegorz Borkowski

Paulina Cybulin

Paulina Cybulin

Monika Kazberuk

Monika Kazberuk

Magdalena Łotysz

Magdalena Łotysz

Anna Petelska

Anna Petelska

Marta Popławska

Marta Popławska

Dorota Sulżyk

Dorota Sulżyk

Daniel Tymoszewicz

Daniel Tymoszewicz

Zatwierdzam / ~~odmawiam~~ zatwierdzenia treść sprawozdania końcowego z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020 przyjętego uchwałą Nr XXXIII/265/17 Rady Gminy Gródek z dnia 27 września 2017 r.

WÓJTA  
Wiesław Kulesza

